



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE SUPERVISION NORMATIVA DE OBRA		
Clave P-7.5.1-PIAS-02	Revisión B	Fecha 5 de Mayo de 2005
Elaboró Ing. Jose Luis Garza Montemayor	Revisó Ing. Moises Mena Sainz	Autorizó Ing. Rodolfo Cázares Garza

ALCANCE : De inicio a termino de la obra

ENTRADAS


PROVEEDOR	SERVICIO	REQUISITOS DEL SERVICIO
PIAS Licitaciones	Supervisión de obra	Contrato y programa de obra Entrega de anticipo

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CONTROLES/REFERENCIA	EQUIPO	REGISTROS
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Se notifica a contratista del Supervisor de Junta de Aguas en obra</div>	Director del PIAS	Autorización	Sistema de computo	Oficio
↓				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Se inicia la bitacora de obra</div>	Supervisor de Obra de JAD	Contrato y terminos de referencia	N/A	Bitacora de supervisor
↓				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Visita de avance de obra grafico y fotografico y cuando se requiera de forma especial</div>	Supervisor de Obra de JAD	Programa de Obra Bitacora Supervisión de obra	Camara fotografica	Reporte de control de obra y avance semanal Fotos
↓				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Elaboración de reporte semanal de avance de obra</div>	Supervisor de Obra de JAD Secretaria del PIAS	Bitacora Programa de Obra Fotografias	Sistema de computo	Avance Semanal
↓				



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE SUPERVISION NORMATIVA DE OBRA		
Clave P-7.5.1-PIAS-02	Revisión B	Fecha 5 de Mayo de 2005
Elaboró Ing. Jose Luis Garza Montemayor	Revisó Ing. Moises Mena Sainz	Autorizó Ing. Rodolfo Cázares Garza

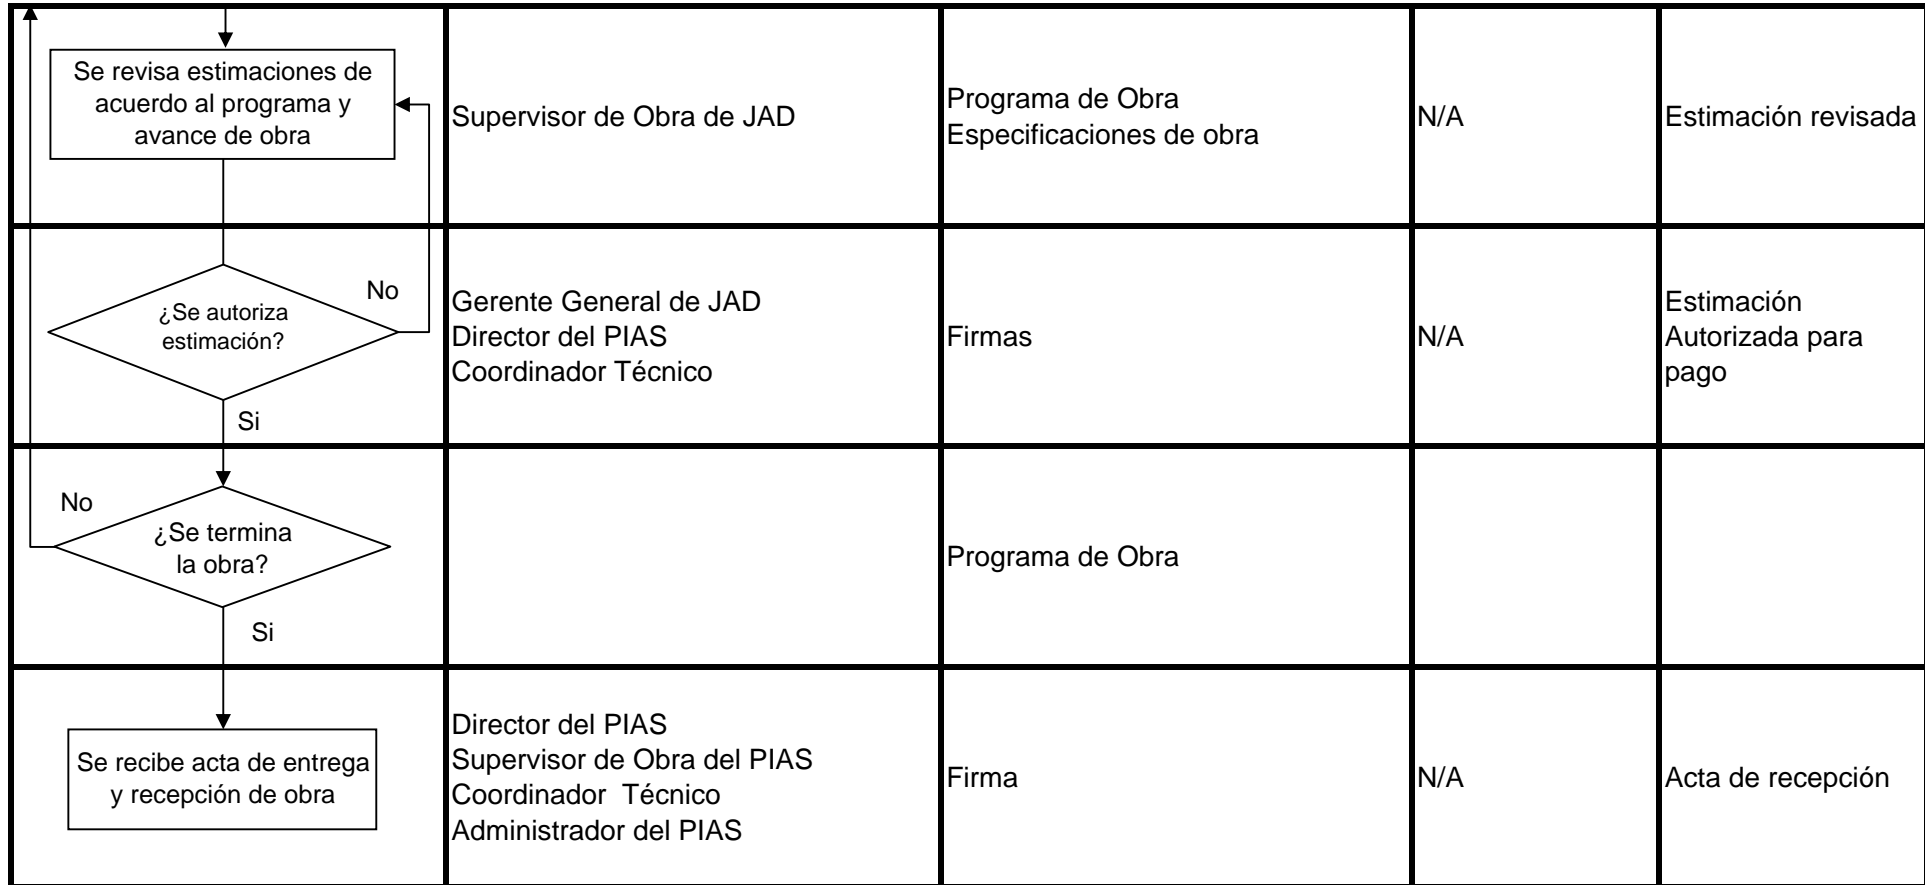

SALIDAS

CLIENTE	PRODUCTO / SERVICIO	REQUISITOS DEL SERVICIO
PIAS	Obra supervisada	Acta de entrega
